## **CURVAS**

CONTROL DE PROGRAMACION DE OBRA Nº octubre - 2024

OBRA

"RENOVACIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO EN EL ALMACÉN DE MATARANI DE LA INTENDENCIA DE ADUANA MOLLENDO, DISTRITO DE MOLLENDO, PROVINCIA DE ISLAY, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

CONTRATISTA CONSORCIO W & F


SUPERVISOR RESIDENTE SIST. CONTRAT. : ING. RENAN LEANDRO ORTEGA BEDREGAL (CIP 62020) ING. FABIAN NOE TRUJILLO CAMPO (CIP 234311)


ENTIDAD MONTO BASE MONTO CONTRATO
PLAZO DE EJECUCICON

INVERSION PUBLICA SUNAT S/. 3,191,691.45 S/. 2,872,522.31

150

PERIODO	PROGRAMADO				EJECUTADO				% AVANCE
	SOLES	ACUM	% MES	% ACUM	SOLES	ACUM	% MES	% ACUM	
Oct-24	40,389.55	40,389.55	1.41%	1.41%	217,911.51	217,911.51	7.59%	7.59%	539.52%
Nov-24	441,693.60	482,083.15	15.38%	16.78%					
Dic-24	518,216,34	1,000,299.49	18.04%	34.82%					
Ene-25	894,990,07	1,895,289.56	31.16%	65.98%					
Feb-25	616,366.95	2,511,656.51	21.46%	87.44%					
Mar-25	360,865.80	2,872,522.31	12.56%	100.00%					

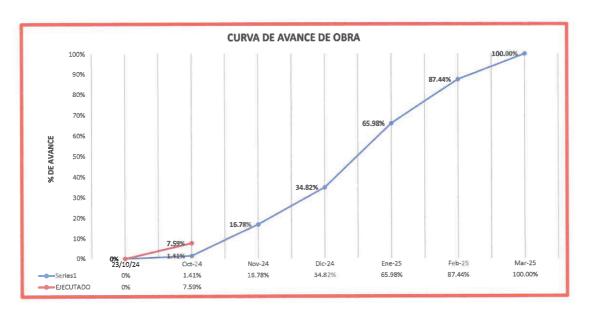

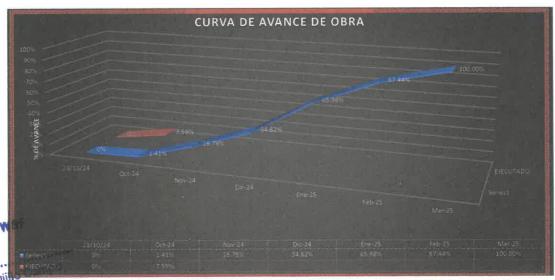

COMMERCION

vig. Fabian Noe Trujil CIP: 234311 Residente de Obra
