VALORIZACION Nº 03 - CONTROL DE AVANCE FISICO DE OBRA

OBRA: : LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA "CREACIÓN DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN EN LA ZONA ESTE 2 DE LIMA METROPOLITANA" CUI 2151569

ENTIDAD: : INVERSION PUBLICA SUNAT (RUC N° 20535690643)

CONTRATISTA: : CONSORCIO EJECUTOR DE OBRAS

SUPERVISOR: : CONSORCIO SUPERVISOR TSA

SUPERVISOR: : ING. RICHARD ENEQUE SECLEN

PLAZO: : 270 DIAS CALENDARIOS

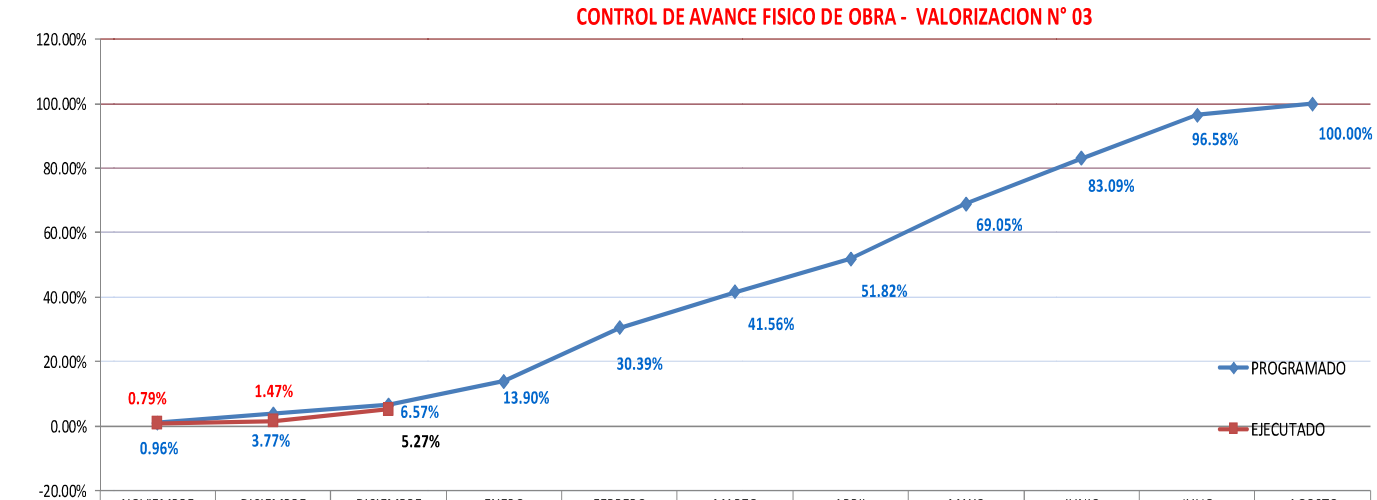

	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO
PROGRAMADO	0.96%	3.77%	6.57%	13.90%	30.39%	41.56%	51.82%	69.05%	83.09%	96.58%	100.00%
EJECUTADO	0.79%	1.47%	5.27%								

En esta tercera valorización se observa que el avance realizado por el contratista se encuentra atrasada con respecto a lo programado.

Ing. Richard Eneque Seclén
JEFE DE SUPERVISIÓN
CONSORCIO SUPERVISOR TSA
REG. CIP. 99775
