VALORIZACIÓN DE OBRA N° 03 - CONTROL DE AVANCE FÍSICO DE OBRA

OBRA : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; ADQUISICIÓN DE EQUIPO; EN EL SISTEMA DE CONTROL DE DESPACHO ANTICIPADO DEL CEBAF TUMBES - EJE VIAL N° 1 DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA ZARUMILLA, DEPARTAMENTO TUMBES" - CUI 2487559

ENTIDAD : INVERSION PUBLICA SUNAT (RUC N° 20535690643)

CONTRATISTA : CONSORCIO EJECUTOR CEBAF

SUPERVISIÓN : JOSE LUIS ROZAS LATORRE

PTO BASE : Feb-23

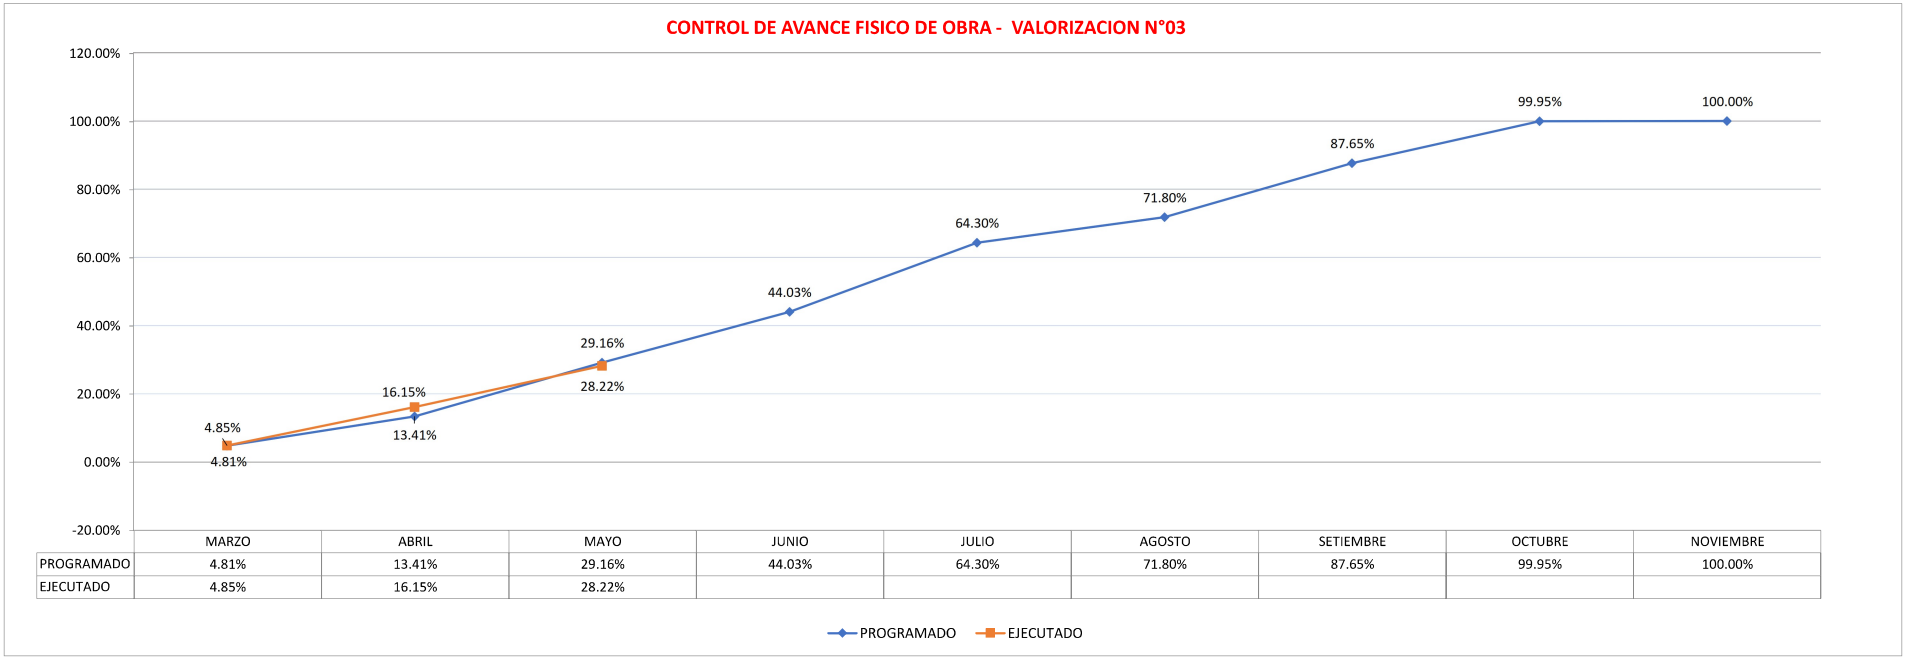

	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
PROGRAMADO	4.81%	13.41%	29.16%	44.03%	64.30%	71.80%	87.65%	99.95%	100.00%
EJECUTADO	4.85%	16.15%	28.22%						

CUADRO COMPARATIVO DE VALORIZACIONES VS PROGRAMADO (Montos sin incluir I.G.V.)

MES		FECHA		AVANCE FISICO PROGRAMADO		% DE AVANCE PROGRAMADO		PORCENTAJE DE AVANCE EJECUTADO				BALANCE	
		INICIO	FIN	AVANCE FISICO PROGRAMADO	AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO	% DEL MES	% ACUMULADO	AVANCE FISICO DEL MES (EJECUTADO)	AVANCE FISICO DEL MES ACUMULADO (EJECUTADO)	% AVANCE FISICO DEL MES (EJECUTADO)	(%AFE) AVANCE FISICO DEL MES ACUM. (EJECUTADO)	DESFACE DE OBRA (%AFAE-%AFAP)	CONDICION DE OBRA (AFAE/AFAP) > 80%
01	MARZO	09/03/2024	31/03/2024	S/. 535,951.65	S/. 535,951.65	4.81%	4.81%	S/. 458,430.60	S/. 458,430.60	4.85%	4.85%	0.04%	100.93%
02	ABRIL	01/04/2024	30/04/2024	S/. 960,127.17	S/. 1,496,078.82	8.61%	13.41%	S/. 1,068,310.74	S/. 1,526,741.34	11.30%	16.15%	2.74%	120.42%
03	MAYO	01/05/2024	31/05/2024	S/. 1,755,803.88	S/. 3,251,882.70	15.74%	29.16%	S/. 1,140,815.20	S/. 2,667,556.54	12.07%	28.22%	-0.93%	96.80%
04	JUNIO	01/06/2024	30/06/2024	S/. 1,658,334.54	S/. 4,910,217.24	14.87%	44.03%	S/. 0.00	S/. 0.00	0.00%	0.00%		0.00%
05	JULIO	01/07/2024	31/07/2024	S/. 2,261,301.34	S/. 7,171,518.58	20.28%	64.30%	S/. 0.00	S/. 0.00	0.00%	0.00%		0.00%
06	AGOSTO	01/08/2024	31/08/2024	S/. 835,822.95	S/. 8,007,341.53	7.49%	71.80%	S/. 0.00	S/. 0.00	0.00%	0.00%		0.00%
07	SETIEMBRE	01/09/2024	30/09/2024	S/. 1,767,768.23	S/. 9,775,109.76	15.85%	87.65%	S/. 0.00	S/. 0.00	0.00%	0.00%		0.00%
08	OCTUBRE	01/10/2024	31/10/2024	S/. 1,371,905.51	S/. 11,147,015.27	12.30%	99.95%	S/. 0.00	S/. 0.00	0.00%	0.00%		0.00%
09	NOVIEMBRE	01/11/2024	03/11/2024	S/. 5,868.79	S/. 11,152,884.06	0.05%	100.00%	S/. 0.00	S/. 0.00	0.00%	0.00%		0.00%
	TOTAL			S/. 11,152,884.06				S/. 2,667,556.54					

JOSE LUIS ROZAS LATORRE-CONSULTOR

Richard Enoque Seclen
JEFE SUPERVISIÓN
CIP. 99775
