"DEMOLICION Y SUSTITUCION DEL CERCO PERIMETRICO DE LA IOARR ARCHIVO CENTRAL SAN LUIS, CUI N°2424025, DISTRITO SAN LUIS"

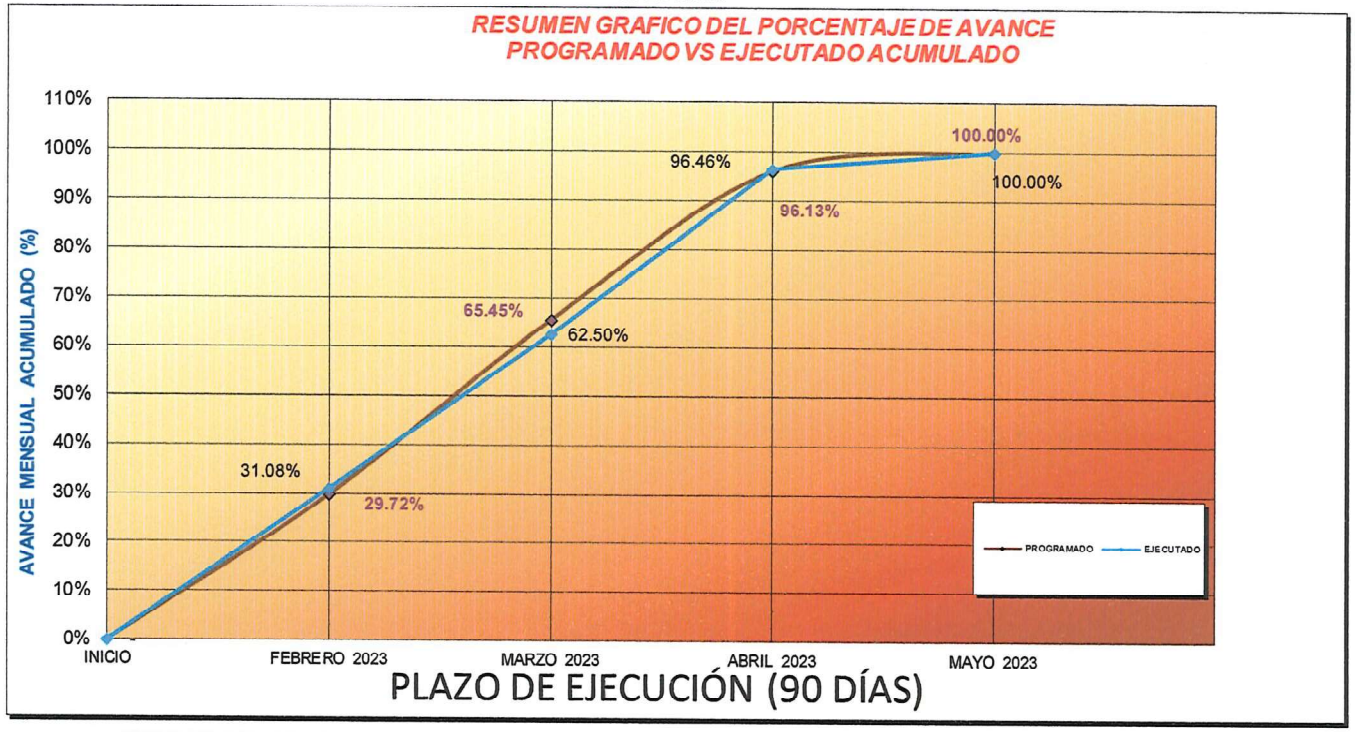

MONTOS VALORIZADOS PROGRAMADOS

MES	MONTOS (Inc/ IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	PARCIAL %	ACUMUL. %
INICIO	-	-	-	-
FEBRERO 2023	218, 662.72	218, 662.72	29.72%	29.72%
MARZO 2023	262, 883.84	481, 546.56	35.73%	65.45%
ABRIL 2023	225, 788.80	707, 335.36	30.69%	96.13%
MAYO 2023	28, 439.02	735, 774.38	3.87%	100.00%
TOTAL	735,774.38		100.00%	

MONTOS VALORIZADOS EJECUTADOS

MES	MONTOS (Inc/ IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	PARCIAL %	ACUMUL. %
INICIO	-	-	-	-
FEBRERO 2023	228,681.57	228,681.57	31.08%	31.08%
MARZO 2023	231,180.87	459,862.44	31.42%	62.50%
ABRIL 2023	249,893.03	709,755.47	33.96%	96.46%
MAYO 2023	26,018.92	735,774.39	3.54%	100.00%
TOTAL	735,774.38		100.00%	

Megacal Contratistas Generales S.A.C
Evelyn E. Hernandez Falcon
Gerente

JORGE BUSTAMANTE GUEVARA
INGENIERO CIVIL
CIP N° 70099

ELMER PASCUAL CONTRATISTAS S.A.C
Juana J. García Valdivia
REPRESENTANTE LEGAL

Ricardo Calixto Moscol
Residente de Obra
Ing. Civil CIP. 57104

EPCON S.A.C
Elmer Pascual Contratistas

00060
