2.5.- CURVA S PROGRAMADO vs EJECUTADO

Se presenta la Curva S Programado vs Ejecutado del Contratista CONSORCIO EJECUTOR DE OBRAS.

VALORIZACION Nº17 - CONTROL DE AVANCE FISICO DE OBRA

OBRA: : LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA "CREACIÓN DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN EN LA ZONA ESTE 2 DE LIMA METROPOLITANA" CUI 2151569
ENTIDAD: : INVERSION PUBLICA SUNAT (RUC N° 20535690643)
CONTRATISTA: : CONSORCIO EJECUTOR DE OBRAS
SUPERVISOR: : CONSORCIO SUPERVISOR TSA
SUPERVISOR: : ING. RICHARD ENEQUE SECLEN
PLAZO: : 270 DIAS CALENDARIOS
AMPLIACIÓN DE PLAZO Nº03: : 90 DIAS CALENDARIOS + 26 DIAS CALENDARIOS
PLAZO NUEVO: : 386 DIAS CALENDARIOS

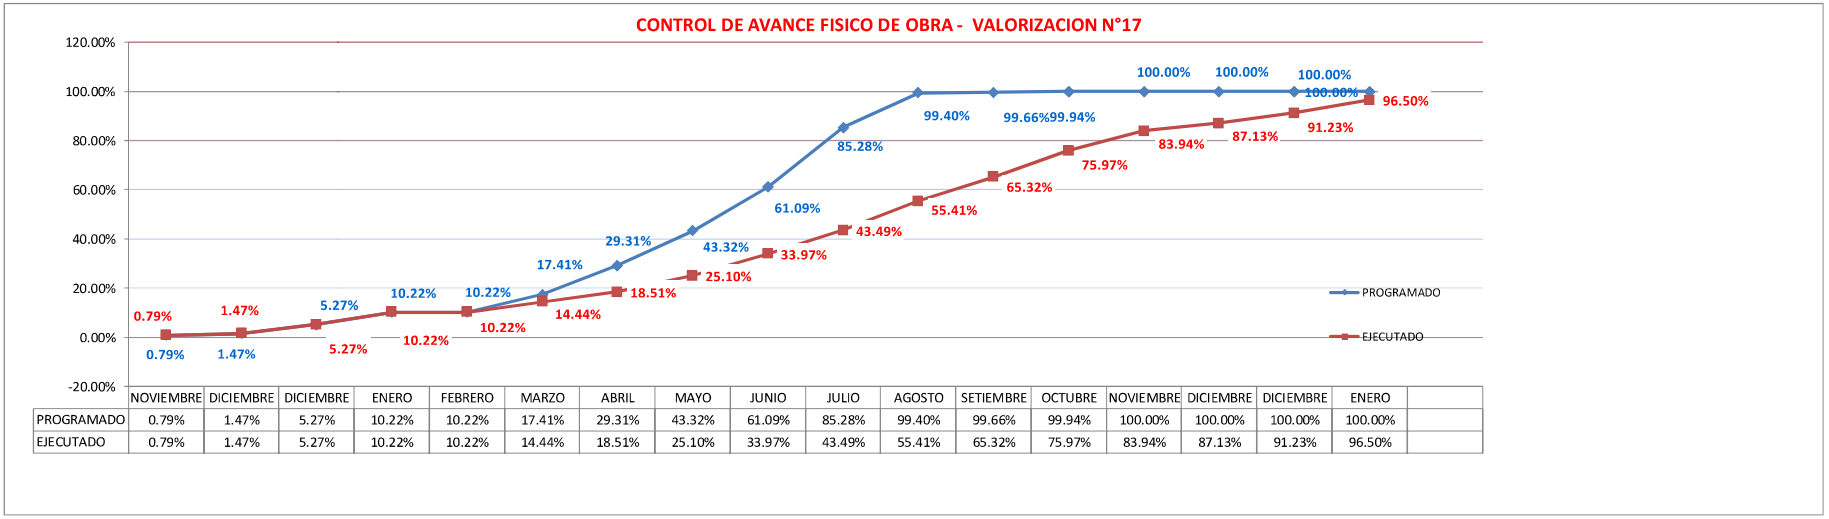

	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO
PROGRAMADO	0.79%	1.47%	5.27%	10.22%	10.22%	17.41%	29.31%	43.32%	61.09%	85.28%	99.40%	99.66%	99.94%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
EJECUTADO	0.79%	1.47%	5.27%	10.22%	10.22%	14.44%	18.51%	25.10%	33.97%	43.49%	55.41%	65.32%	75.97%	83.94%	87.13%	91.23%	96.50%

Ing. Richard Eneque Seclén
JEFE DE SUPERVISIÓN
CONSORCIO SUPERVISOR TSA
REG. CIP. 99775
