CURVA COMPARATIVA DE AVANCE FISICO MENSUAL PROGRAMADO V/S EJECUTADO (ACUMULADO)

OBRA: "CONSTRUCCION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; ADQUISICION DE EQUIPO; EN EL SISTEMA DE CONTROL DE DESPACHO ANTICIPADO DEL CEBAF TUMBES - EJE VIAL Nº 1, DISTRITO ZARUMILLA, DEPARTAMENTO TUMBES" - CUI 2487559

LIC. PUBL. Nº : Nº 04-2023-SUNAT/8I1000

CONTRATISTA: CONSORCIO EJECUTOR CEBAF

ING° RESIDENTE: Ing. Gloria Cecilia Rojas Cusipuma

ING° SUPERVISOR: Ing. Richard Eneque Seclén.

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL : 9/03/2024

FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL : 3/11/2024

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA : 240 DIAS CALENDARIOS

ESTADO DE OBRA 16.15% ADELANTADO

VALORIZACION N° 02 DEL 01-04-2024 al 30-04-2024

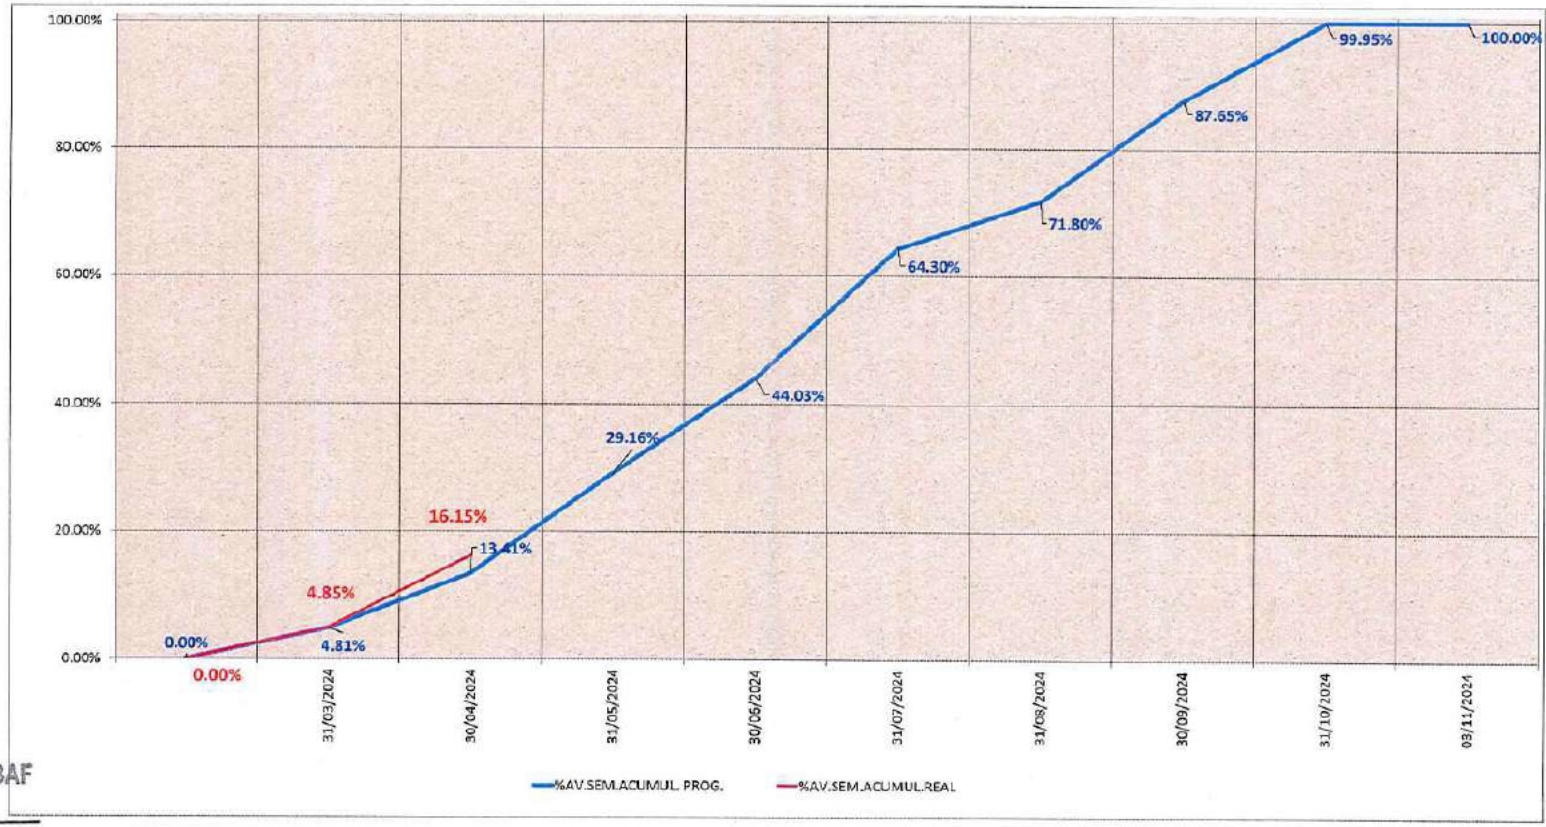

JOSE LUIS ROSAS ATORRE-CONSULTOR

Richard Eneque Seclen
JEFE SUPERVISION
CIP. 99775

CONSORCIO EJECUTOR CEBAF

Ing. Gloria Cecilia Rojas Cusipuma
RESIDENTE DE OBRA

SEMANAS	31/03/2024	30/04/2024	31/05/2024	30/06/2024	31/07/2024	31/08/2024	30/09/2024	31/10/2024	03/11/2024
%AV.SEM.ACUMUL. PROG.	4.81%	13.41%	29.16%	44.03%	64.30%	71.80%	87.65%	99.95%	100.00%
%AV.SEM.ACUMUL.REAL	4.85%	16.15%							
