CURVA "S"

OBRA : "CREACIÓN DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO CANINO DE LA SUNAT PARA EL CONTROL ADUANERO A NIVEL NACIONAL EN EL DISTRITO DE LA ESPERANZA – PROVINCIA DE TRUJILLO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"
RESIDENTE : ING. PERCY ANTONIO SANTISTEBAN JACINTO
INSPECTOR : ING. JUAN HURTADO ZAMORA

MES VALORIZADO : abr 2024

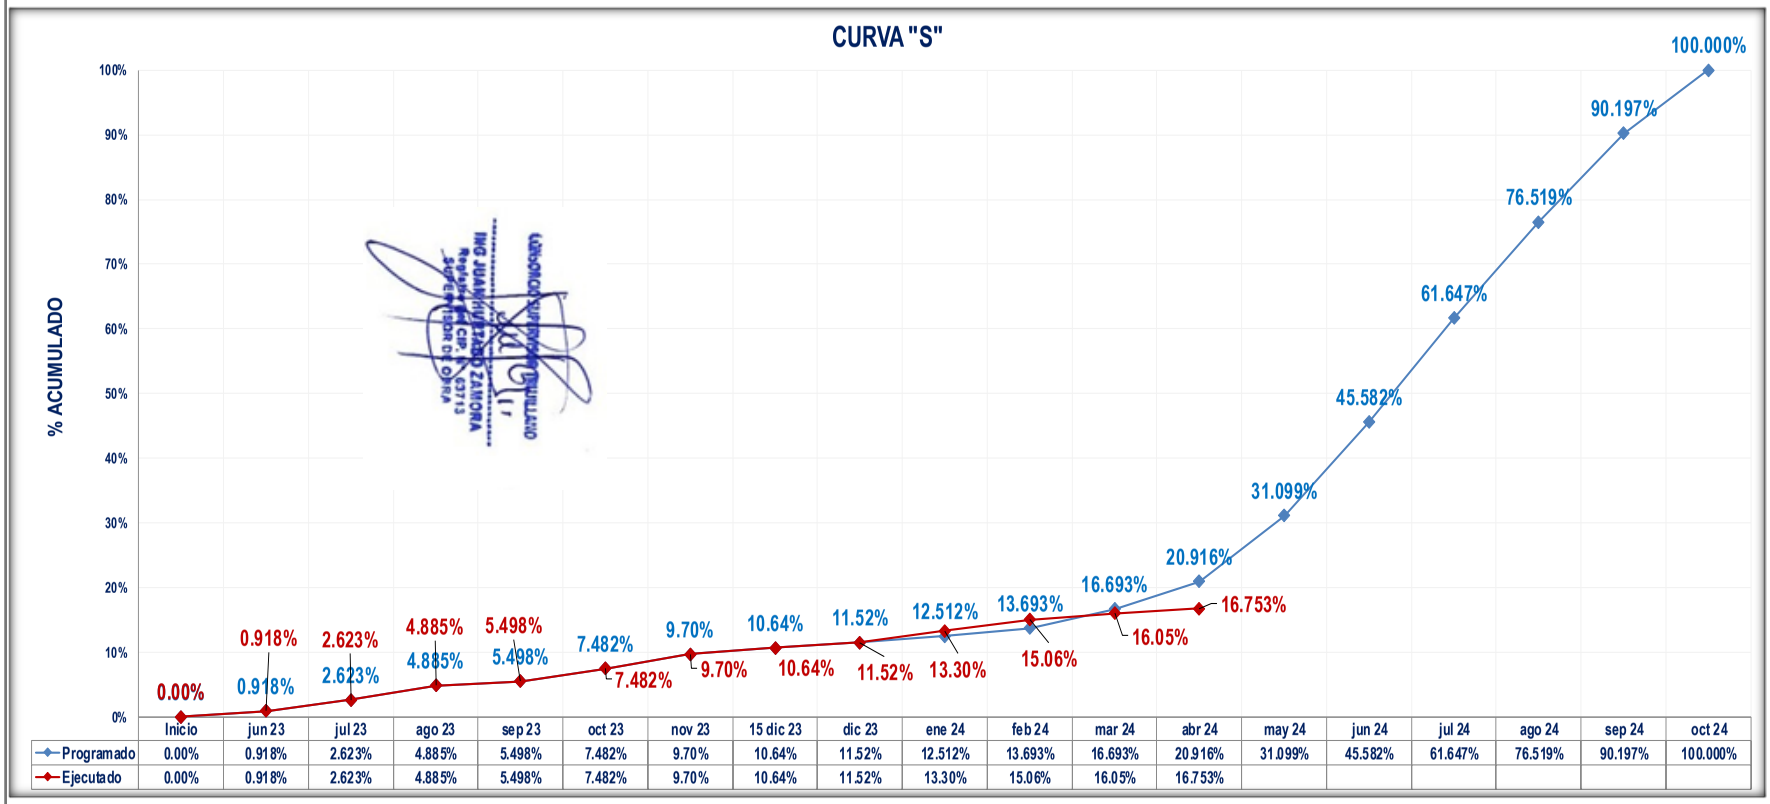

	Inicio	jun 23	jul 23	ago 23	sep 23	oct 23	nov 23	15 dic 23	dic 23	ene 24	feb 24	mar 24	abr 24	may 24	jun 24	jul 24	ago 24	sep 24	oct 24
Programado	0.00%	0.918%	2.623%	4.885%	5.498%	7.482%	9.70%	10.64%	11.52%	12.512%	13.693%	16.693%	20.916%	31.099%	45.582%	61.647%	76.519%	90.197%	100.000%
Ejecutado	0.00%	0.918%	2.623%	4.885%	5.498%	7.482%	9.70%	10.64%	11.52%	13.30%	15.06%	16.05%	16.753%						

DESCRIPCIÓN	Inicio	jun 23	jul 23	ago 23	sep 23	oct 23	nov 23	15 dic 23	dic 23	ene 24	feb 24	mar 24	abr 24	may 24	jun 24	jul 24	ago 24	sep 24	oct 24
PARCIAL	-	315,567.33	585,592.29	777,135.54	210,558.34	681,731.16	760,929.79	323,358.92	304,150.27	339,888.36	405,510.81	1,030,874.33	1,450,848.02	3,498,774.68	4,975,971.58	5,519,545.82	5,109,619.09	4,699,388.67	3,367,942.49
ACUMULADO	-	315,567.33	901,159.62	1,678,295.16	1,888,853.50	2,570,584.66	3,331,514.45	3,654,873.37	3,959,023.64	4,298,912.00	4,704,422.81	5,735,297.14	7,186,145.16	10,684,919.84	15,660,891.42	21,180,437.25	26,290,056.33	30,989,445.00	34,357,387.49
% PARCIAL	0.00%	0.918%	1.704%	2.262%	0.613%	1.984%	2.215%	0.941%	0.885%	0.989%	1.180%	3.000%	4.223%	10.183%	14.483%	16.065%	14.872%	13.678%	9.803%
% ACUMULADO	0.00%	0.918%	2.623%	4.885%	5.498%	7.482%	9.70%	10.64%	11.52%	12.512%	13.693%	16.693%	20.916%	31.099%	45.582%	61.647%	76.519%	90.197%	100.000%
PARCIAL	-	315,567.33	585,592.29	777,135.54	210,558.34	681,731.16	760,929.79	323,358.92	304,150.27	609,681.70	604,592.85	341,740.21	240,793.25						
ACUMULADO	-	315,567.33	901,159.62	1,678,295.16	1,888,853.50	2,570,584.66	3,331,514.45	3,654,873.37	3,959,023.64	4,568,705.34	5,173,298.19	5,515,038.40	5,755,831.65						
% PARCIAL	0.00%	0.918%	1.704%	2.262%	0.613%	1.984%	2.215%	0.941%	0.885%	1.775%	1.760%	0.995%	0.701%						
% ACUMULADO	0.00%	0.918%	2.623%	4.885%	5.498%	7.482%	9.70%	10.64%	11.52%	13.30%	15.06%	16.05%	16.753%						

Carlos Alan Alva Vargas
INGENIERO CIVIL
CIP N° 73822
